



POINT DE SITUATION DU PROJET RHÔNE

IRWIN GAFNER
DIRECTEUR TECHNIQUE

24.06.2021

ABVL – JUIN 21

PROJET RHÔNE: EXTÉRIEUR DU BATEAU



■ Terminé: Peinture extérieure du bateau, primaire intérieur



■ A faire: Pose de la timonerie (prévu en octobre), finitions, peinture intérieure




PROJET RHÔNE: ROUES À AUBES



■ Terminé: Sablage et peinture des roues à aubes



■ En cours: Remontage des pâles et des excentriques, pose des portes vitrées

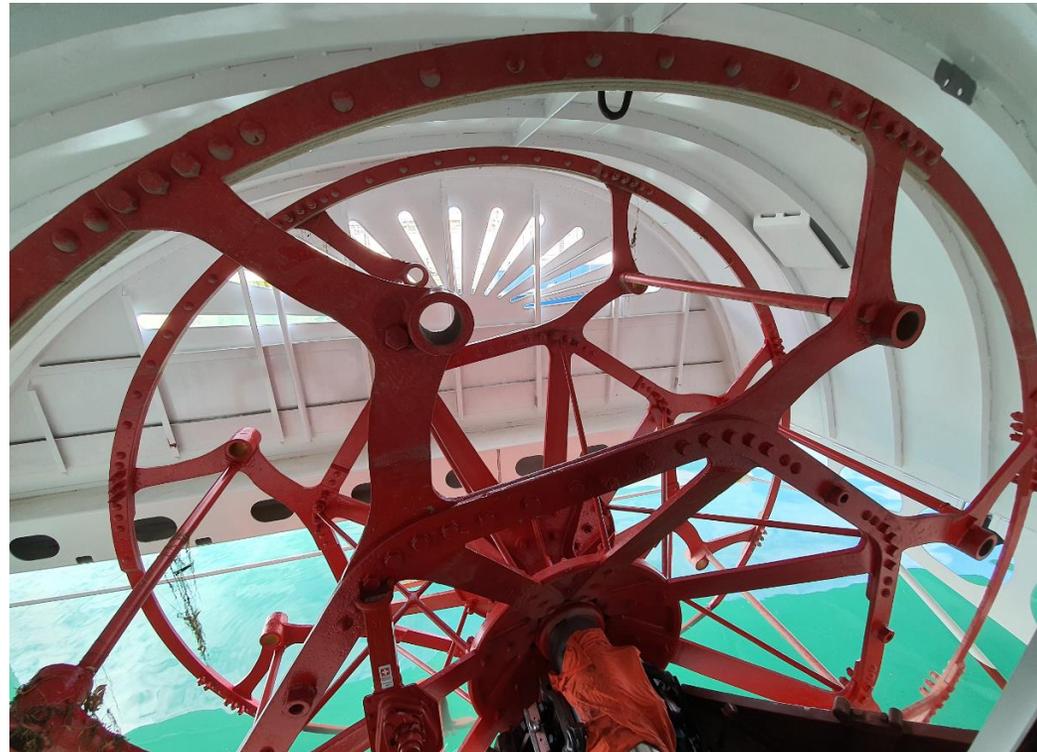

ABVL – JUIN 21


PROJET RHÔNE: PONTS EN BOIS



■ Terminé: Ponts intérieurs & extérieurs



■ A faire: Ponçage de finition des ponts & application du vernis

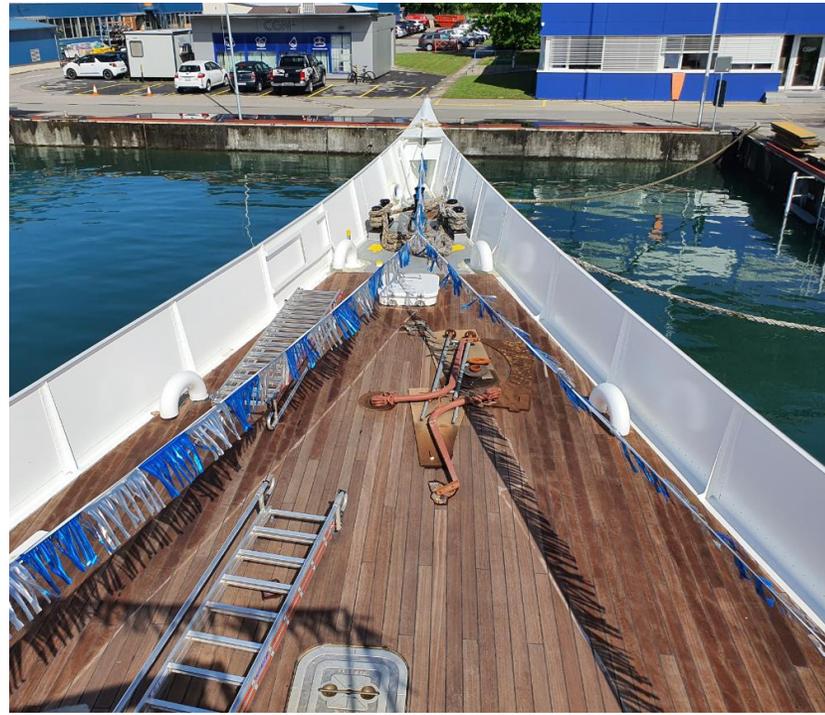

ABVL – JUIN 21


PROJET RHÔNE: TAMBOURS



■ Terminé: Pose des tambours et support des radeaux de sauvetage



■ En cours: Aménagements ext. & intérieurs des 8 locaux (caisse, WC, cabine, etc..)

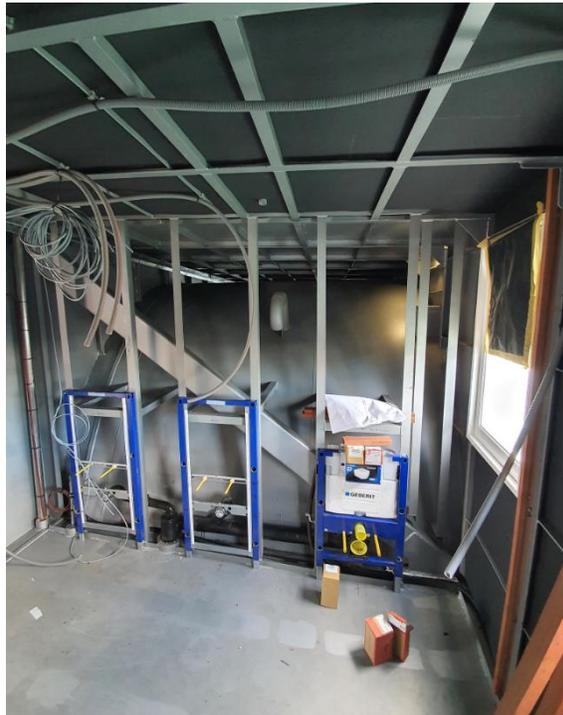

ABVL – JUIN 21

PROJET RHÔNE: MACHINE À VAPEUR




■ Terminé: -



■ En cours: Alignement du vilebrequin et remontage des conduites



■ A faire: Isolation, remontage (soupapes, bielles, graissage, hydraulique), essais

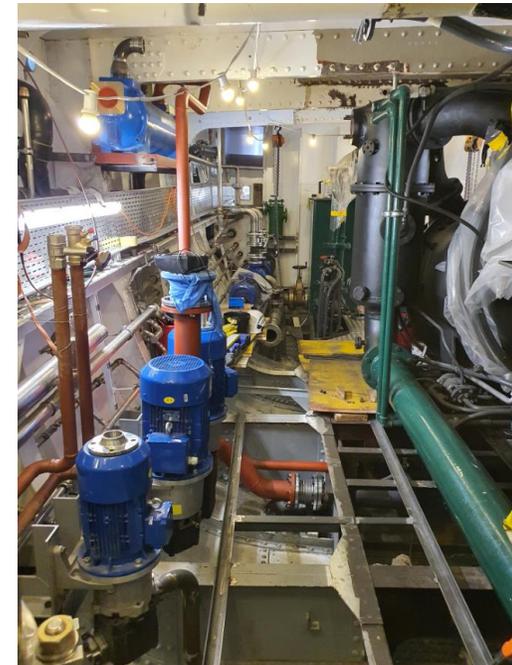


ABVL – JUIN 21

PROJET RHÔNE: CHAUDIÈRE



- Terminé: Pose et isolation de la chaudière (août 2020)
- En cours: Pose et isolation des conduites vapeur (notamment le sifflet)
- A faire: Electricité, installation des adoucisseurs, essais et mise en service

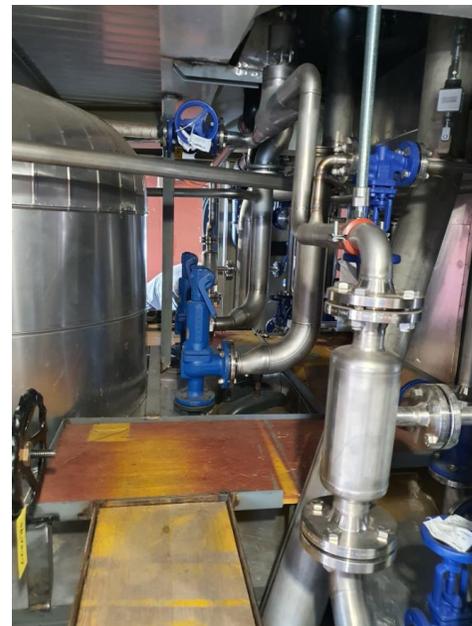


ABVL – JUIN 21

PROJET RHÔNE: COUPÉES ET COURSIVES



- Terminé: Peinture du bastingage
- En cours: Peinture des coursives (sols)
- A faire: Portes des coupées, guirlandes, finitions

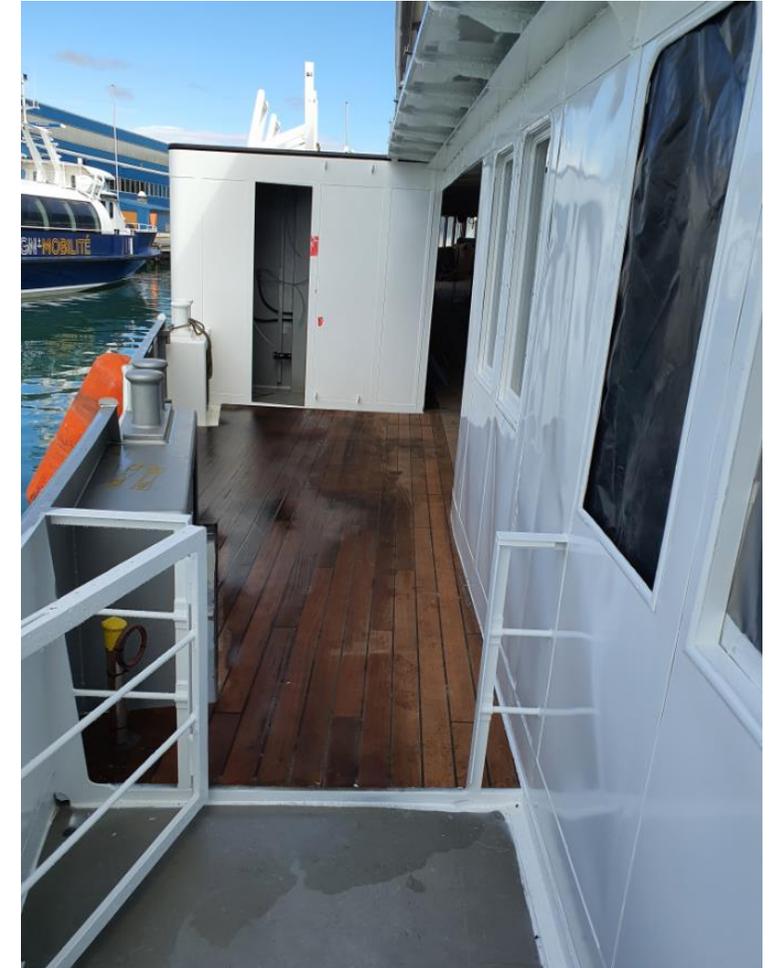

ABVL – JUIN 21

PROJET RHÔNE: ESCALIER PONT SUPÉRIEUR




- Terminé: Pose de l'escalier
- En cours: Mains courantes
- A faire: Pose des épontilles et des nez de marches



ABVL – JUIN 21

PROJET RHÔNE: SALON BELLE EPOQUE

-  ■ Terminé: Pose des sols (résines) et des plafonds
-  ■ En cours: Restauration des marqueteries (ébénisterie), luminaires
-  ■ A faire: Repose du tapis et des boiseries

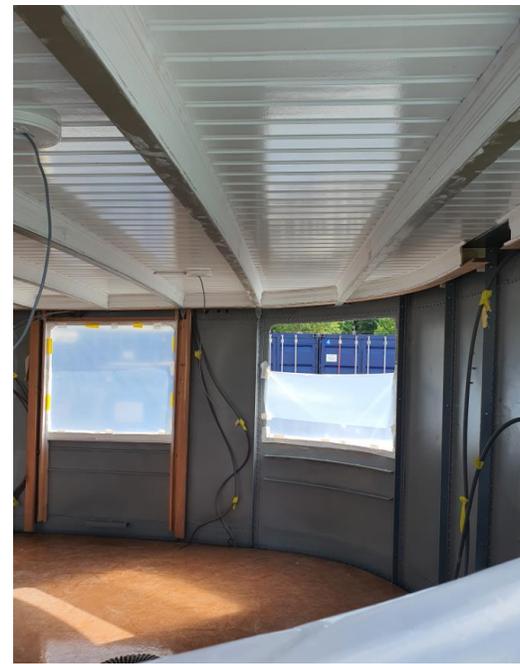

ABVL – JUIN 21

PROJET RHÔNE: TENTE FIXE & JARDIN D'HIVER



■ Terminé: Réalisation et pose des panneaux en composites (13 x)



■ A faire: Pose des vitrages du jardin d'hiver «sky-frame», fermeture cheminée



ABVL – JUIN 21


PROJET RHÔNE: FUMOIR



■ Terminé: Pose de la structure (aluminium)



■ En cours: Aménagements du fumoir (sabords, luminaires, etc.) & boiseries

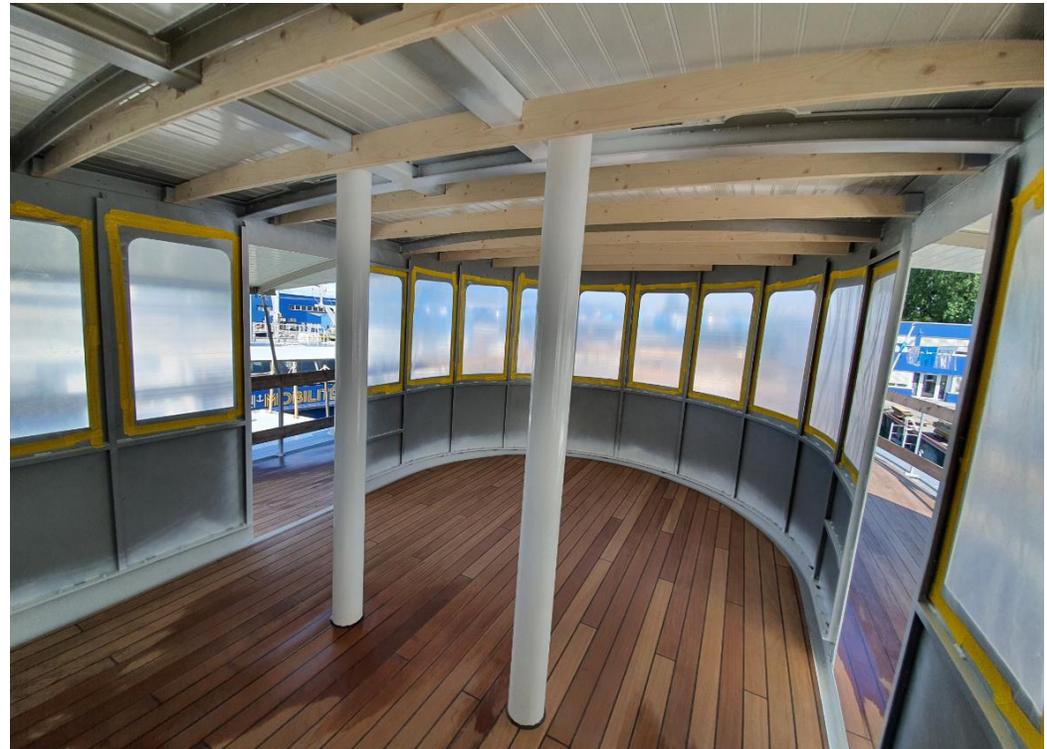

ABVL – JUIN 21

PROJET RHÔNE: PETIT SALON & PUIITS DE LUMIÈRE



■ Terminé: Pose de la structure (aluminium)



■ En cours: Aménagements du petit salon (sabords, luminaires, etc.) & boiseries



ABVL – JUIN 21



PROJET RHÔNE: PLANNING

- Prochaines dates clés:
 - Prochain COPIL: 14 juillet 2021
 - Fin des travaux: 18 décembre 2021 (objectif CGN: Avant la fin de l'année 2021)
 - Essais & mise en service: Janvier (voir février) 2022
 - Inauguration: Fin janvier 2022 (date exacte encore à valider après le COPIL)
 - Mise en exploitation: (février) - Mars 2022
- Risques / difficultés:
 - COVID-19 (reprise de l'économie «V-shape», délais des fournisseurs)
 - Electricité ⇒ Chemin critique jusqu'à la fin de projet
